PourSync

ส่งทันเวลา เทต่อเนื่อง ทุกเที่ยว

AI วางแผนรถโม่คอนกรีตผสมเสร็จ · โจทย์ AI Concrete



ทีม ลำนำหมื่นลี้

AI Hackathon Route Optimization 2026

โจทย์: วางแผนรถโม่ทุกเที่ยวของวันพรุ่งนี้

8	76	48	~200
โรงงาน	รถโม่	ลูกค้า	เที่ยว/วัน

คอนกรีตรอไม่ได้: มาเร็วเสี่ยงแข็งบนรถ · มาช้าเสี่ยง cold joint



ทุกเที่ยวต้องเลือก: โรงงานไหน · รถคันไหน · เริ่มโหลดกี่โมง

วัดผลด้วย SLA ของลูกค้า 7 ระดับ แล้วจึงดูกำไร

ตรงเวลา ±15 นาที

เทต่อเนื่อง + ไม่ถูกปฏิเสธ

ระดับลูกค้า	ตรงเวลา	ต่อเนื่อง
G1 Blue Diamond	95%	100%
G2	90%	95%
…	…	…
G7 Basic	65%	70%

SLA
จำนวนวันที่ผ่าน จาก 5 วัน

Contribution
รวมสูงกว่า

ระยะทาง
น้อยกว่า

ผ่านครบทุกเกณฑ์ของวัน (สูงสุด 14 เกณฑ์) จึงถือว่าผ่าน SLA

ทดสอบ 4 วัน + Day 5 วันลับ · รันออฟไลน์ภายใน 5 นาที

4 วัน 4 เหตุการณ์: แผนเดิมผ่าน SLA 0 วัน

Day 1

วันทำงานปกติ

งานใหญ่เริ่มพร้อมกัน

คนขับลาป่วย

ไม่ผ่าน

Day 2

วันเปิดเทอม

ห้ามรถ 06:30–08:30

รถติดเช้า

ไม่ผ่าน

Day 3

ลอยกระทง

รถติดบ่าย

ปิดถนนตั้งแต่ 17:00

ไม่ผ่าน

Day 4

วันหยุด

คนขับลา 35%

โรงงานปิด / ลดไลน์

ไม่ผ่าน

แผนพนักงานเดิม 0/4 วัน

solver ตั้งต้นผู้จัด 0/4 วัน

ข้อมูลในระบบไม่ได้ถูกทุกช่อง: เราตรวจก่อนใช้

โรงงาน	ระบบบอก	กำลังผลิตจริง	ประวัติโหลดสูงสุด
P05 บางนา	3 ไลน์	2 ไลน์	10 เที่ยว/ชม.
P07 ตลิ่งชัน	2 ไลน์	3 ไลน์	12 เที่ยว/ชม.

P05 ปิดซ่อมไลน์ 3 ถึงสิ้นปี · P07 ติดตั้งไลน์ 3 แล้ว

ตรวจแผนกับกำลังผลิตจริงแล้ว ผล SLA ไม่เปลี่ยน

นัด 07:30 แต่ห้ามเข้าถึง 08:30: ต้องขอเลื่อนเวลา

ลองแผน → ให้ตัวจำลองตรวจ → รับเมื่อดีขึ้นจริง

ลองแผน

ปรับรถ โรงงาน หรือเวลา

→

ตัวจำลองตรวจ

aiconcrete.Sim

→

รับเมื่อดีขึ้น

เก็บแผนที่ดีที่สุด

↶ ลองปรับแผนรอบถัดไป

ใช้ตัวจำลองทางการของผู้จัด ผลจึงสอดคล้องกับการประเมิน

กติกาทั่วไป ไม่ผูกกับวันใดวันหนึ่ง พร้อมใช้กับ Day 5

5 ขั้นที่ต่อยอดจาก Greedy ตั้งต้น

1

Greedy

เรียงตามเวลานัด

โรงงานใกล้ × รถเหมาะ

→

2

ปรับ Load Start

สาย X นาที

โหลดเร็วขึ้น X นาที

→

3

ค้นหาเวลาเพิ่ม

ลอง −60 ถึง +10 นาที

เลือกเวลาที่ตรงนัด

→

4

ขอเลื่อนเวลานัด

เมื่อติดช่วงห้ามเข้า

เฉพาะลูกค้าที่ยอม

→

5

เลือกจาก 6 แบบ

ใกล้สุด 2/3/4 โรงงาน

× เพิ่มไลน์หรือไม่

Day 4 ผ่าน

Day 2: 6 → 10 เกณฑ์

Day 3 ผ่าน


เลือกแผนที่ผ่าน SLA ก่อน แล้วจึงเลือก Contribution สูงกว่า

ไม่เกิน 20 วินาที/วัน

เพดานผู้จัด 5 นาที

ผ่าน SLA 0 → 2 วัน · Contribution +158,724 บาท

Day	เหตุการณ์	SLA	เกณฑ์ผ่าน	Contribution (บาท)
1	วันทำงานปกติ	ไม่ผ่าน	9/14	517,561
2	เปิดภาคเรียน	ไม่ผ่าน	10/14	349,852
3	ลอยกระทง	ผ่าน ✓	14/14	403,719
4	วันหยุด	ผ่าน ✓	12/12	222,713

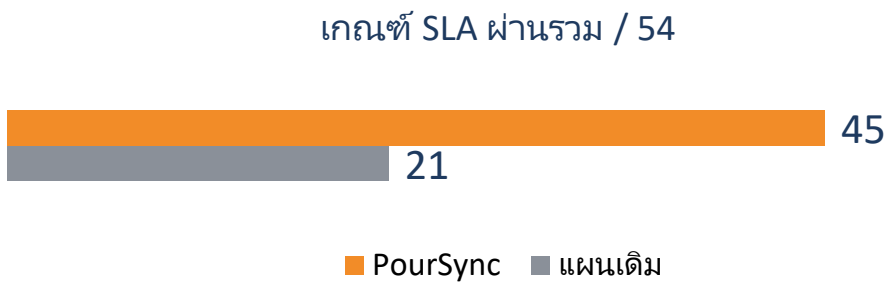

+11.9%

1,335,121 → 1,493,845 บาท

cold joint 39 → 5 · ปฏิเสธ 22 → 6 เที่ยว

คุณค่าที่ PourSync ส่งมอบ

ลูกค้า

Grade สูงก่อน

ใช้ความยืดหยุ่นของลูกค้าที่ยอมเลื่อน

ธุรกิจ

+158,724

บาทใน 4 วัน (+11.9%)

ลดงานเสีย

22 → 6

เที่ยวถูกปฏิเสธ · cold joint 39 → 5

ข้อแลกเปลี่ยน: ระยะทาง 18,200 → 23,522 กม. เพราะเลือก SLA ก่อน

ขั้นต่อไป: Grade สูงจองรถ/ไลน์ก่อน · ลดรถเปล่า · โยกรถเหนือไปใต้ตั้งแต่เช้า

ส่งทันเวลา เทต่อเนื่อง ทุกเที่ยว — ขอบคุณครับ
